



MODELO OPERACIONAL EM AÇÃO

Duas Demandas, Um Processo.



Como duas solicitações concorrentes — uma de retenção, uma de pré-fechamento — caminharam pelo funil de intake, racionalização e execução até estarem prontas para handoff.

ÍNDICE

O que você vai encontrar

Seis partes que cobrem o ciclo completo: desde a captura no intake até o plano de execução com sequenciamento das duas demandas em paralelo.

01	O Cenário	p. 4
	<i>PokerPlan, o trimestre, as duas demandas que chegaram</i>	
02	O Modelo Operacional	p. 6
	<i>Camadas do funil, papéis e gates de qualidade</i>	
03	Demanda 1 — Queue Voting	p. 9
	<i>Banco Meridional, renovação em risco, RP rejeitado e ressubmetido</i>	
04	Demanda 2 — Room Access Control	p. 13
	<i>Construtora Ágil, três incógnitas no intake, Discovery e escalada ao CTO</i>	
05	Plano de Execução	p. 20
	<i>Capacidade, sequenciamento, milestones e gatilhos de escalada</i>	
06	Comparativo e Aprendizados	p. 25
	<i>O que o processo provou e o que levamos adiante</i>	

COMO LER ESTE DOCUMENTO

Cada parte abre com o contexto e fecha com a transição para a próxima. As **PÍLULAS COLORIDAS** marcam status; as caixas em creme destacam fatos e citações; as tabelas concentram os dados que normalmente ficariam diluídos no texto. As referências entre colchetes — por exemplo **INT-2026-001** — apontam para os artefatos originais do caso.

01

O Cenário

PokerPlan é uma plataforma SaaS B2B para cerimônias de planejamento ágil. Tem clientes pagantes e está em fase de crescimento. Foi nesse momento — entre uma renovação importante e um deal de pré-fechamento — que duas demandas concorrentes entraram no funil em uma mesma semana.

Sobre a plataforma

PokerPlan é uma plataforma SaaS B2B para cerimônias de planejamento ágil — Planning Poker, refinamento de backlog, estimativas de história. A empresa já passou do estágio inicial: tem clientes enterprise pagantes, ARR consistente e está em fase de crescimento por expansão dentro de contas e por novos contratos no segmento mid-market.

O modelo operacional do time é estruturado em **camadas com gates**: nada entra em execução sem antes passar por triagem, racionalização e um pacote de prontidão (*Readiness Package*) revisado pelo PM. Esse processo é o que permite que duas demandas muito diferentes — uma simples, uma com risco arquitetural — corram em paralelo sem se atropelarem.

O trimestre em questão

No início de março de 2026, duas demandas chegaram com poucos dias de diferença. Vieram de origens distintas, com riscos distintos, mas competindo pelas mesmas pessoas e pelo mesmo sistema.

2DEMANDAS EM
PARALELO**5**PESSOAS NO TIME DE
ENGENHARIA**~60**DIAS ÚTEIS
ESTIMADOS DE
ESFORÇO**90d**PRAZO MAIS CURTO
(RENOVAÇÃO)

As duas demandas, lado a lado

DEMANDA 1 · QUEUE VOTING

Cliente: Banco Meridional**Origem:** CS, em chamada de revisão trimestral**Tipo:** Retenção — renovação em 90 dias**Risco:** Baixo · Sem escalada arquitetural**Dor:** Sem mecanismo para enfileirar histórias ou ocultar votos. Cerimônias com 10+ itens ficam 40-60% mais longas.

DEMANDA 2 · ACCESS CONTROL

Cliente: Construtora Ágil**Origem:** Vendas, em chamada pré-fechamento**Tipo:** Pré-fechamento — deal condicionado**Risco:** Alto · Escalada ao CTO + LGPD**Dor:** Sem controle de quem entra na sala, sem anonimato, sem distinção votante/observador.

POR QUE ESTE CASO IMPORTA

As duas demandas são reais o suficiente para forçar o processo a se mostrar. Uma testa a **velocidade do funil** (uma renovação não espera). A outra testa a **robustez dos gates** (um deal não pode ser comprometido antes da capacidade ser avaliada). Juntas, elas exercitam todas as camadas do modelo.

O que aconteceu, em sequência

O quadro abaixo mostra o caminho que cada demanda percorreu desde o registro de intake até a entrada em execução. Note que a Demanda 1 ficou mais curta no funil (passou direto pela triagem, mas teve o RP rejeitado uma vez); a Demanda 2 demorou mais para chegar à racionalização porque precisou de uma janela de Discovery, mas o RP passou de primeira.

DATA	DEMANDA 1 — QUEUE VOTING	DEMANDA 2 — ACCESS CONTROL	MARCADORES
12 mar	Intake registrado pelo CS	—	INTAKE
13 mar	Triagem do PO → Product Ready	—	TRIAGEM
15 mar	—	Intake registrado por Vendas	INTAKE
17 mar	—	Triagem do PO → Discovery	3 INCÓGNITAS
18 mar	—	Discovery aberto. CTO notificado.	TIME-BOX 2 SEM.
20 mar	RP v1 submetido ao PM	Spike CTO: Azure AD viável via OIDC	
21 mar	—	Revisão de infra: gap LGPD identificado	COMPLIANCE
22 mar	RP v1 rejeitado pelo PM	Chamada com cliente: Jira é desejo, não bloqueador	GATE ATIVADO
25 mar	—	Discovery encerrado em 7 dias	NO TIME-BOX
27 mar	—	RP v1 aprovado de primeira	APROVADO
28 mar	RP v2 aprovado	—	APROVADO
29 mar	Plano de Execução EP-2026-001 publicado pelo PM cobrindo as duas demandas		EXECUÇÃO

OBSERVAÇÃO

O Discovery da Demanda 2 não *atrasou* nada — ele **protegeu** a entrega. Os três bloqueadores (Azure AD, Jira, LGPD) seriam descobertos de qualquer jeito; descobri-los antes de comprometer escopo evitou que Vendas confirmasse um prazo impossível para o cliente.

02

O Modelo Operacional

Antes de mergulhar nas demandas, vale entender o funil pelo qual elas passaram. Cada camada existe para responder uma pergunta — e o gate seguinte só abre quando a anterior está respondida.

O funil, da captura à execução

Toda demanda que entra na plataforma percorre o mesmo caminho. O que varia é a *velocidade* com que cada uma o percorre — e em quais gates ela é obrigada a pausar.

01 · INTAKE Captura CS, Vendas ou produto registram a demanda em formato estruturado: origem, dor, premissas, constraints.	02 · TRIAGEM Decisão PO classifica: Product Ready, Discovery, Backlog ou Rejeitada. Decide se há escalada ao CTO.	03 · DISCOVERY* Resolver incógnitas Time-boxed (até 2 semanas). Só acontece se a triagem identifica incógnitas que bloqueiam o escopo.	04 · RACIONALIZAÇÃO Readiness Package PO redige 12 seções: contexto, escopo, regras, riscos, esforço, critérios de sucesso. CTO contribui se há escalada.	05 · EXECUÇÃO Plano + entrega PM avalia capacidade, sequencia demandas, define milestones. Tech Lead detalha tarefas. Time entrega.
---	--	---	--	--

** Etapa condicional. Demandas sem incógnitas pulam diretamente do passo 02 para o passo 04.*

O que cada gate pergunta

GATE	PERGUNTA QUE ELE RESPONDE	QUEM DECIDE
Triagem	Esta demanda é real, escopável e alinhada com o roadmap? Precisa de Discovery ou pode ser racionalizada agora?	PO
Discovery	As incógnitas que bloqueiam o escopo foram resolvidas dentro do time-box?	PO + CTO (quando há escalada)
Aprovação do RP	O pacote tem informação suficiente para o PM planejar capacidade sem surpresas?	PM
Avaliação de capacidade	Cabe no time disponível, no prazo desejado, sem comprometer outras demandas?	PM
Release	Os critérios de aceite foram validados? O QA aprovou? Há sign-off do cliente quando necessário?	PM + Tech Lead

Quem faz o quê

Cada papel tem um escopo de decisão claro. Ninguém compromete prazo no lugar do PM. Ninguém decide arquitetura no lugar do CTO. Ninguém aprova escopo no lugar do PO. É essa separação que faz o processo aguentar pressão comercial.

CS · Customer Success Ana Costa Captura demandas vindas de clientes existentes. Dona dos sinais de retenção. Não negocia escopo nem prazo.	Vendas Rafael Souza Captura demandas vindas de prospects e deals em pipeline. Não confirma prazos ao cliente antes da avaliação de capacidade do PM.
PO · Product Owner Lucas Mendes Triagem, decisão de Discovery, racionalização. Dono do Readiness Package. Aplica os limites de escopo durante a execução.	CTO Rodrigo Lima Avalia escaladas arquiteturais. Conduz spikes técnicos. Decide trade-offs de infraestrutura e compliance.
PM · Project Manager Carla Ribeiro Avaliação de capacidade. Sequenciamento de demandas. Mapa de milestones. Comunicação de cronograma. Único papel que confirma prazo externamente.	Tech Lead Marco Viana Breakdown técnico após aprovação do RP. Decisões de implementação (ADRs). Estimativas refinadas e estratégia de rollout.

Vendas fez um compromisso informal de prazo. Nenhuma data externa pode ser confirmada até que o Discovery conclua e o PM execute uma avaliação de capacidade.

— NOTA DE RISCO NO INTAKE INT-2026-002

Esse princípio aparece duas vezes neste caso: uma vez como aviso no intake, outra vez como gatilho explícito de escalada no plano de execução. Não é um detalhe — é o que separa um cronograma realista de uma promessa quebrada.

Os artefatos que cada papel produz

ARTEFATO	RESPONSÁVEL	PARA QUÊ SERVE
Intake	CS / Vendas	Capturar a demanda com origem, dor, premissas e constraints. Não negocia escopo nem prazo.
Readiness Package	PO (+ CTO)	12 seções consolidando o que será construído, para quem, com quais riscos, em quanto esforço.
Plano de Execução	PM	Capacidade, sequenciamento, milestones, gates, gatilhos de escalada para todas as demandas ativas.
Product Backlog	PO	Épicos e histórias de usuário com critérios de aceite — o "o quê" para o time.
Tech Backlog	Tech Lead	ADRs, tarefas, estimativas refinadas, DoD, estratégia de rollout — o "como" para o time.

03

Queue Voting

Banco Meridional, cliente enterprise, renovação em 90 dias. A demanda parece simples — controlar a sequência de estimativas e ocultar votos. E é simples. Mas o gate do PM ainda assim a devolveu na primeira tentativa.

O cliente e a dor

Cliente	Banco Meridional — enterprise, 4 squads ativos, 3 squads pendentes
Origem da demanda	Chamada trimestral de revisão com CS
Reportador	Ana Costa (Customer Success)
Tipo	Funcionalidade
Prioridade	ALTA — risco de renovação (90 dias)
Receita em jogo	R\$ 84.000 ARR (renovação) + R\$ 28.000 ARR de expansão bloqueada

O problema, em uma frase

Facilitadores não têm como controlar a sequência das estimativas, e os votos aparecem em tempo real — criando viés de ancoragem e atrasando cerimônias em 40 a 60%.

Durante o sprint planning do Banco Meridional, o facilitador compartilha uma lista com 20+ histórias. Os participantes pulam à frente, leem itens futuros, formam opiniões prematuras e desestabilizam o fluxo de estimativa. Não existe mecanismo para enfileirar itens e revelá-los um de cada vez. Além disso, votos são visíveis em tempo real conforme submetidos — quem vota primeiro influencia quem vota depois.

WORKAROUND ATUAL DO CLIENTE

Os Scrum Masters estão compartilhando histórias *uma de cada vez via chat*, adicionando 15-20 minutos de overhead por cerimônia. Duas ferramentas concorrentes já suportam essa funcionalidade — foi mencionado como lacuna de diferenciação na própria chamada de renovação.

Por que a CS sinalizou como risco de renovação

- O contrato vence em 90 dias e a feature foi mencionada explicitamente na conversa.
- Existem 3 squads pendentes que não foram integrados por causa dessa lacuna de UX — R\$ 28.000 ARR de expansão bloqueada.
- O workaround atual é visível e desgastante. Não é um problema escondido — é uma queixa recorrente.

DECISÃO DO PO NA TRIAGEM

Caminho: Product Ready → Racionalização direta. Sem Discovery. Escalada arquitetural ao CTO: não necessária — apenas mudanças de UI e estado de sessão, sem nova infraestrutura. As cinco premissas do intake (WebSocket existente suporta, persistência extensível, sem dependência de TI do cliente, etc.) foram consideradas razoáveis.

O Readiness Package — e o gate do PM

Em 20 de março, o PO submeteu a primeira versão do Readiness Package (**RP-2026-001 v1**) ao PM. Dois dias depois, o pacote voltou. Rejeitado.

Faltava estratégia de rollout e critérios de aceite indefinidos para edge cases — desconexão do facilitador, votos parciais no momento do reveal, reconexão de participante durante o item.

— JUSTIFICATIVA DA REJEIÇÃO NO HISTÓRICO DE REVISÃO

Por que isso é uma boa notícia

A rejeição não é falha — é o processo funcionando. O PM não tem como planejar capacidade se não sabe como o time vai rolar a feature para produção, nem como o QA vai validar o comportamento sob desconexão. Aprovar um RP incompleto significa empurrar essas decisões para o meio da execução, onde elas custam muito mais.

O GATE FUNCIONOU

RP v1 rejeitado em 22 mar. RP v2 ressubmetido com correções em 28 mar. Aprovado. Seis dias de retrabalho no RP — contra semanas de retrabalho que teriam vindo depois, em execução.

O que mudou de v1 para v2

LACUNA APONTADA PELO PM	CORREÇÃO EM V2
Estratégia de rollout ausente	Adicionada estratégia: migração roda apenas em sessões com status=encerrado; sessões ativas usam schema antigo até encerramento natural; sem downtime.
Desconexão do facilitador	Definido período de graça de 5 min com restauração de estado de sessão. Fallback: sessão encerra limpa com notificação aos participantes.
Votos parciais no reveal	Participantes que não votaram quando a revelação é acionada veem seu espaço como "Não votou" — sem bloqueio do facilitador.
Participante entra durante um item	Vê o item ativo e pode votar. A posição na fila não é exibida. A consistência de estado é garantida server-side.

O escopo aprovado — RP v2

O Readiness Package final entrega duas capacidades coordenadas: **fila de questões** e **votação secreta**. As regras estão definidas no nível do servidor (não apenas client-side, o que evita bypass via DevTools), e a persistência de sessão é estendida para suportar reconexões.

O que está dentro

FILA DE QUESTÕES

- UI do facilitador para adicionar, reordenar e remover itens
- Controle "Revelar próximo item" para avançar um de cada vez
- Participantes veem apenas o item ativo
- Controles auxiliares: pular, retornar, encerrar

VOTAÇÃO SECRETA

- Votos ocultos até o facilitador acionar "Revelar"
- Aplicação server-side — payload WebSocket só envia **"votou"**, não o valor
- Facilitador vê contagem, não valores, até a revelação
- Pós-revelação: avançar fila ou re-votar item atual

O que ficou fora

- Timer por item (backlog futuro)
- Revelação automática após todos votarem (toggle de preferência, fase futura)
- Redesign mobile (layout atual se aplica)
- Co-facilitação (modelo de facilitador único permanece)
- Integração Jira/Linear para importação de histórias

Esforço e custo

14dESFORÇO ESTIMADO
TOTAL**0**NOVA INFRA
NECESSÁRIA**0**CUSTO RECORRENTE
NOVO**26/abr**

RELEASE ALVO

PRONTO PARA HANDOFF AO PM

Em 28 de março, o RP v2 entra na fila de planejamento de execução. A Demanda 1 está pronta para ser sequenciada — com baixo risco, escopo apertado e prazo de renovação suficiente para absorver imprevistos.

04

Room Access Control

Construtora Ágil, deal de pré-fechamento, R\$ 42.000 ARR condicionados à funcionalidade. Vendas comprometeu informalmente 60 dias ao cliente. Três incógnitas de integração no intake forçaram o PO a abrir Discovery antes de qualquer escopo ser definido.

O cliente e a dor

Cliente	Construtora Ágil — mid-market, em onboarding
Origem da demanda	Chamada pré-fechamento de Vendas
Reportador	Rafael Souza (Vendas)
Tipo	Funcionalidade · Compliance · Integração
Prioridade	ALTA — bloqueador de pré-fechamento
Receita em jogo	R\$ 42.000 ARR direto + 2 deals em pipeline com mesma necessidade

O problema, em uma frase

A sala de planejamento é totalmente aberta — qualquer pessoa com o link entra, vê todos os participantes e vota. Para um cliente que opera com prestadores externos e sob governança de dados, isso não é aceitável.

A Construtora Ágil realiza cerimônias com participação mista: funcionários internos e prestadores externos. A política interna deles proíbe que prestadores tenham visibilidade sobre identidades uns dos outros. Além disso, querem que gerentes de produto participem como observadores — assistindo, sem votar nem influenciar estimativas.

O dono da sala precisa de três controles que hoje não existem:

1. **Quem entra:** acesso somente por convite ou com aprovação obrigatória.
2. **Quem vê quem:** modo anônimo, com aliases entre votantes.
3. **Quem vota:** distinção entre papéis Votante e Observador.

SINAL VERMELHO NO INTAKE

Vendas fez um compromisso informal de 60 dias ao cliente durante a chamada. Esse compromisso não foi validado contra capacidade — e o PO marcou explicitamente no intake que nenhuma data externa pode ser confirmada até o Discovery encerrar e o PM rodar a avaliação. O gatilho de escalada está armado.

O que tornou esta demanda diferente

Diferente da Demanda 1, esta chegou com três incógnitas que bloqueiam a racionalização. Não se trata de detalhar critérios de aceite — se trata de não saber, ainda, o que pode ser entregue. O PO não tinha como redigir um Readiness Package sem antes saber se Azure AD é viável, se Jira é obrigatório, e se a residência de dados conforme LGPD é alcançável.

DECISÃO DO PO NA TRIAGEM

Caminho: ~~Product Ready~~ → Discovery. Time-box de 2 semanas (18/mar a 01/abr). Escalada arquitetural ao CTO: sim — e ampliada de "modelo de dados de participantes" para também incluir viabilidade Azure AD OIDC, escopo de integração Jira e postura LGPD.

Discovery — as três incógnitas

Durante a chamada de intake, Vendas trouxe três dependências de integração que não estavam previstas e que bloqueavam a racionalização. O PO abriu Discovery em 18 de março com time-box de duas semanas e mobilizou três frentes paralelas.

As três frentes

#	INCÓGNITA	QUEM RESOLVE	MÉTODO
1	Azure AD — SSO completo, group-claim leve ou sincronização via webhook?	CTO	Spike técnico (2-3 dias)
2	Integração Jira — requisito obrigatório ou desejável para o deal fechar?	Construtora Ágil (via Vendas)	Chamada com cliente
3	Residência de dados — onde estão hoje os dados de identidade de participantes?	CTO	Revisão de infraestrutura (1 dia)

As resoluções

FRENTE 1 · AZURE AD — SPIKE DO CTO, 20 MAR

A integração é viável via OIDC com group-claim, usando a camada de auth existente (que já suporta OAuth2). Não exige SSO completo. A plataforma pode solicitar o claim `groups` no login e mapear grupos AD para papéis no momento de entrada na sessão. Esforço: 4-6 dias.

Dependência externa identificada: o cliente precisa registrar a plataforma como aplicação permitida no portal Azure deles. O prazo dessa ação está fora do nosso controle.

FRENTE 2 · JIRA — CHAMADA COM O CLIENTE, 22 MAR

A TI do cliente (Fernanda Ramos) confirmou que Jira não é obrigatório para o deal fechar. Atribuição manual via Azure AD é suficiente para a Fase 1. Movido para o backlog como item separado (`BACKLOG-2026-007`).

PRÓXIMA PÁGINA

A frente mais delicada do Discovery foi a terceira — a revisão de infraestrutura para LGPD. Ela revelou um gap de residência de dados que não estava no radar do intake.

Frente 3 — LGPD e residência de dados

A revisão de infraestrutura conduzida pelo CTO em 21 de março identificou um gap que não estava no escopo original do intake — e que, se ignorado, exporia a empresa a risco regulatório direto.

O ACHADO

GAP DESCOBERTO

O cluster primário da plataforma roda em `us-east-1`. Dados de identidade de participantes de clientes brasileiros — nomes, emails e metadados de sessão — estão hoje armazenados fora do Brasil. Entregar a funcionalidade à Construtora Ágil sem tratar isso exporia a empresa a risco LGPD direto.

AS TRÊS OPÇÕES AVALIADAS PELO CTO

OPÇÃO	DESCRIÇÃO	ESFORÇO	RISCO
A	Migrar tabela de participantes para <code>sa-east-1</code> para todos os tenants	3-4 semanas	Interrompe todos os clientes durante migração
B	Roteamento por tenant — dados armazenados na região declarada pelo tenant	6-8 semanas	Mudança a nível de plataforma, alta complexidade
C	Armazenar em <code>sa-east-1</code> só para clientes que sinalizam requisito LGPD	~2 semanas	Adiciona roteamento condicional, mas escopado

DECISÃO DO CTO

Opção C para este release. As opções A e B são decisões estratégicas de plataforma que requerem alinhamento com o CEO e não podem ser comprometidas para um único deal. A Opção C resolve o caso da Construtora Ágil e cria um padrão reutilizável para futuros requisitos de compliance regional — uma vez estabelecido, qualquer próximo cliente regulado entra pelo mesmo trilha.

O Discovery encerra em 7 dias

Em 25 de março — sete dias após a abertura, bem dentro do time-box de duas semanas — todas as incógnitas estavam resolvidas. A demanda saiu de Discovery e voltou para racionalização com escopo significativamente diferente do que aparecia no intake.

#	INCÓGNITA	RESOLUÇÃO	IMPACTO NO ESCOPO
1	Integração Azure AD	Viável via group-claim OIDC. 4-6 dias.	ADICIONADO
2	Integração Jira	Não obrigatório. Movido para backlog.	REMOVIDO
3	Residência de dados	Opção C — flag LGPD por cliente, roteamento sa-east-1 . ~2 semanas.	ADICIONADO

A complexidade revisada da demanda é significativamente maior do que estimado originalmente. O Readiness Package deve refletir o trabalho de integração Azure AD e residência de dados LGPD.

— NOTA DO PO NO ENCERRAMENTO DO DISCOVERY

RP aprovado em v1

Em 27 de março, PO e CTO submeteram o Readiness Package em conjunto. O PM aprovou na primeira revisão. A diferença de comportamento entre as duas demandas no gate de aprovação tem uma explicação simples: a Demanda 2 chegou com a contribuição direta do CTO em todas as decisões arquiteturais, com riscos mapeados, com opções avaliadas e com um caminho claro de mitigação. O PM não tinha perguntas em aberto.

O escopo final aprovado

CAPACIDADES FUNCIONAIS

- Modos de acesso: Aberto, Somente convite, Aprovação obrigatória
- Modo anônimo com aliases server-side
- Papéis Votante / Observador atribuíveis pelo dono
- Remoção de participante em sessão ativa
- Compatibilidade retroativa com salas existentes (opt-in por sala)

CAMADAS TÉCNICAS

- Migração aditiva do modelo de participantes
- Filtragem server-side de payloads WebSocket no modo anônimo
- Tokens de convite 128-bit, expiram no primeiro uso
- Integração group-claim OIDC com Azure AD
- Roteamento LGPD Opção C — endpoint **sa-east-1** condicional

O custo real do escopo aprovado

A estimativa que entrou no intake era de 25 dias. O Readiness Package aprovado, com Azure AD e LGPD Opção C incluídos, soma 41 dias. Não é um estouro — é o que o trabalho realmente custa quando todas as peças estão sobre a mesa.

Esforço estimado

25d ESTIMATIVA NO INTAKE	41d ESTIMATIVA PÓS- DISCOVERY	+16d DELTA (AZURE AD + LGPD)	30/mai RELEASE ALVO
--	---	--	---

De onde vêm os 16 dias adicionais

TRABALHO ADICIONADO PELO DISCOVERY	ESFORÇO	SENIORIDADE NECESSÁRIA
Integração de group-claim OIDC com Azure AD	5 dias	Senior
Roteamento de residência de dados LGPD (Opção C, sa-east-1)	10 dias	Senior
QA adicional: validação LGPD em tenant brasileiro	+1 dia	QA

PORQUE ESSA DIFERENÇA IMPORTA

Se a Demanda 2 tivesse pulado o Discovery, o time teria começado a execução com estimativa de 25 dias e descoberto LGPD no meio do caminho. Vendas teria confirmado 60 dias ao cliente baseado nessa estimativa. O deal estaria, hoje, com promessa quebrada. O Discovery custa tempo; *não* fazer Discovery custa credibilidade.

Os riscos que o RP carrega para o PM

O Readiness Package aprovado entrega ao PM um mapa de riscos detalhado. Eles não desaparecem com a aprovação — eles passam a ser responsabilidade do plano de execução. Os mais críticos para o cronograma são:

RISCO	PROB.	IMPACTO	MITIGAÇÃO
Registro Azure AD atrasado pelo TI do cliente	Média	Alto	Spec e checklist enviados ao TI do cliente cedo. PM acompanha como bloqueador de milestone — gatilho de escalada se não cumprido até 14/abr.
Conflito entre prazo de Vendas e capacidade real	Alta	Alto	PM executa avaliação de capacidade antes de qualquer data ser comunicada externamente. PO é dono deste gate.
Migração do modelo de participantes quebra sessões ativas	Baixa	Alto	Mudança aditiva apenas. Novos campos nullable com defaults correspondendo ao comportamento atual.
Pressão de expansão de escopo (SSO, audit logs)	Média	Médio	Exclusões explícitas documentadas no limite de escopo. PO aplica o limite — qualquer adição requer novo intake.
LGPD requer trabalho de infra além da Opção C	Baixa	Alto	CTO confirmou o escopo da Opção C antes do compromisso. Se ampliar, CEO decide.

O que o RP da Demanda 2 trouxe que o da Demanda 1 não tinha

- Avaliação arquitetural do CTO em 6 dimensões — modelo de dados, multi-tenancy, membership em tempo real, segurança, performance, observabilidade.
- Dependências externas explicitamente mapeadas — registro Azure AD pelo TI do cliente, provisionamento RDS `sa-east-1`, sign-off LGPD pré-release.
- Premissas validadas item a item — sete premissas no intake foram cada uma reavaliada pelo CTO após o Discovery.
- Plano de migração retrocompatível — uma promessa explícita de que sessões abertas existentes não são afetadas.

PRONTO PARA HANDOFF AO PM

Em 27 de março, ambas as demandas estão prontas para entrar no plano de execução. O PM tem dois pacotes na mesa — um com 14 dias e baixo risco, outro com 41 dias e dependências externas — e precisa orquestrar uma janela em que as duas caibam sem se atropelarem.

05

Plano de Execução

O PM recebe os dois Readiness Packages aprovados e produz o EP-2026-001 em 29 de março. Capacidade avaliada, demandas sequenciadas, milestones definidos, gatilhos de escalada armados. A janela de execução vai de 1 de abril a 31 de maio.

Avaliação de capacidade

O time tem cinco pessoas com disponibilidade conhecida a partir de 1 de abril. O esforço somado das duas demandas é 55 dias úteis (14 + 41). A capacidade da janela cobre o esforço — mas o sequenciamento precisa respeitar conflitos em sistemas compartilhados.

O time

PESSOA	PAPEL	SENIORIDADE	DISPONÍVEL EM
Diego Alves	Engenheiro Backend	Senior	01/abr
Priya Nair	Engenheira Backend	Mid-senior	01/abr
Camila Torres	Engenheira Frontend	Mid	01/abr
Lucas Park	Engenheiro Frontend	Mid	01/abr
Fernanda Lima	QA	QA	08/abr

Os sistemas compartilhados (e por isso as demandas devem ser sequenciadas)


SISTEMA	DEMANDA 1 TOCA	DEMANDA 2 TOCA
Event bus WebSocket	Novos eventos (item_revealed, votes_revealed)	Novos eventos (join_request, role_changed)
Schema de sessão	Campos de fila + estado de revelação	Papel do participante, access_mode, invite_token
Modelo de participante	Exibição de ocultação de votos	Reescrita completa da máquina de estado

DECISÃO DO PM — RECOMENDAÇÃO NO PLANO

Sequenciar a Demanda 1 primeiro. Menor risco, entrega mais curta, e resolve o prazo de renovação. A Demanda 2 começa em paralelo, mas em trilhas que não conflitam com o backend da Demanda 1, e ganha foco total após o release de 26/abr.

Como as duas demandas se encaixam na janela

O diagrama abaixo mostra as faixas de trabalho de cada demanda dentro da janela de 8 semanas. As barras sólidas são trabalho contínuo; as barras tracejadas representam ciclos de QA e release. A Demanda 1 (Queue Voting) termina antes que o esforço da Demanda 2 entre na fase crítica de modos de acesso e LGPD.

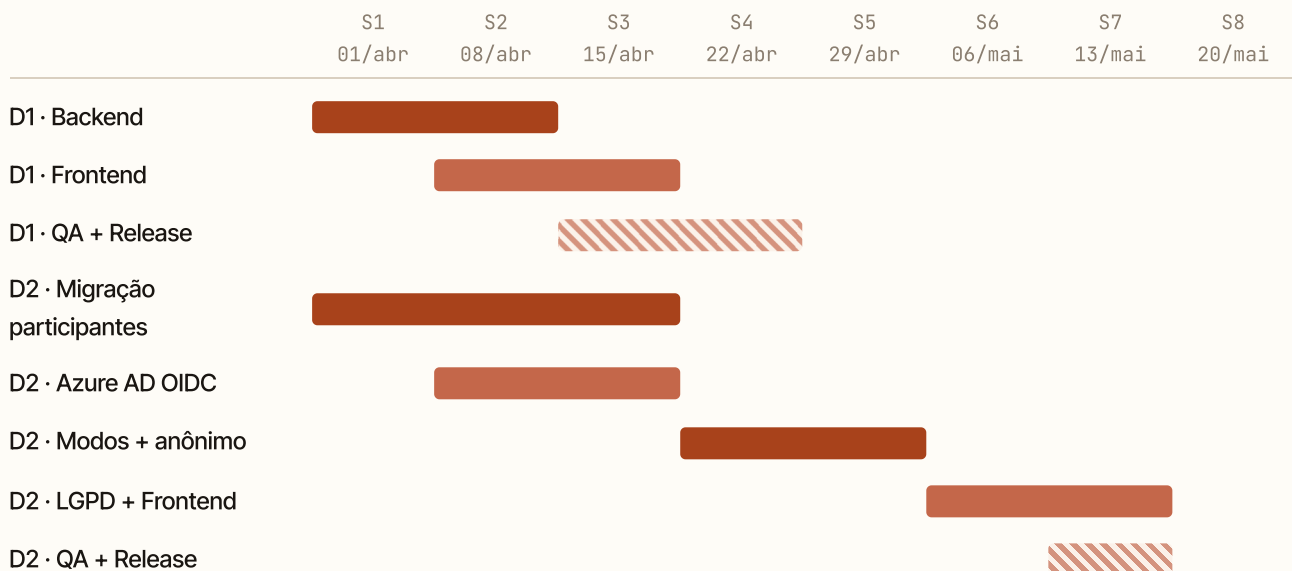

Como ler o diagrama

- Sequenciamento, não paralelismo cego. A migração do modelo de participantes (D2) começa em paralelo com o backend da D1 porque toca *partes diferentes* do schema. Quando os dois sistemas começam a competir pelo mesmo subsistema, a D1 já está em frontend ou QA.
- Azure AD começa cedo, com risco externo. A faixa de OIDC depende do registro pelo TI do cliente. Se atrasar, todo o bloco da D2 desliza.
- QA da D2 absorve LGPD + multi-tenant. O último sprint é exclusivamente validação — sem desenvolvimento concorrente.

Milestones críticos

Os milestones são gates ao longo do caminho. Cada um tem responsável, data alvo e um critério explícito de "concluído". Sem absorção silenciosa: qualquer atraso superior a 3 dias úteis é comunicado ao PO imediatamente.

Demanda 1 — Queue Voting

M	MARCO	RESPONSÁVEL	GATE
M1	Breakdown Package completo	Tech Lead	PM confirma contexto suficiente
M2	Backend completo	Diego Alves	Code review + testes verdes
M3	Frontend completo	Camila + Lucas	Revisão do Tech Lead aprovada
M4	QA completo	Fernanda Lima	Critérios de aceite validados
M5	Release · 26/abr	PM + Tech Lead	Aprovação de release do QA

Demanda 2 — Access Control

M	MARCO	RESPONSÁVEL	GATE
M2	Migração do modelo de participantes	Priya Nair	Schema em staging, retrocompat verificada
M3	Azure AD OIDC integrado	Diego Alves	Bloqueado até cliente registrar app (14/abr)
M4	Modos de acesso + modo anônimo	Priya + Diego	Aplicação server-side verificada
M5	Roteamento LGPD sa-east-1	Diego Alves	CTO confirma postura. Validação com tenant BR.
M7	QA completo	Fernanda Lima	Funcional + segurança + multi-tenant + LGPD
M8	Sign-off LGPD do cliente	TI Construtora Ágil	Cliente confirma residência atendida
M9	Release · 30/mai	PM + Tech Lead	QA + sign-off LGPD do cliente

Gatilhos de escalada

O PM não absorve atrasos silenciosamente. Cada condição abaixo dispara uma comunicação explícita ao PO e, quando aplicável, sobe a cadeia. O objetivo não é punir o atraso — é evitar que ele só apareça quando virar um problema irrecuperável.

CONDIÇÃO	AÇÃO DO PM	DESTINO
Registro Azure AD não confirmado até 14/abr	PM notifica PO. PO aciona Vendas para pressionar TI do cliente.	PO → Vendas → Cliente
Instância RDS sa-east-1 não provisionada até 05/mai	PM escala ao CTO. CTO escala ao CEO se aprovação de procurement for necessária.	CTO → CEO
QA da Demanda 1 revela bloqueador antes do release	PM segura o release. Tech Lead faz triagem. Se > 2 dias, PM notifica PO do risco de renovação.	PO → CS → Banco Meridional
Qualquer milestone atrasado > 3 dias úteis	PM produz mapa de milestones revisado e comunica ao PO. Sem absorção silenciosa.	PO
Solicitação de adição de escopo durante execução	PM rejeita. Qualquer adição requer um novo registro de intake.	PO

PRINCÍPIO OPERACIONAL

Cada gatilho tem três partes: **uma condição observável** (não "se eu achar que vai atrasar", mas "se a data X passar"), **uma ação imediata** do PM e **um destino explícito** na cadeia. Atrasos não são escondidos. Decisões de absorção, replanejamento ou escalada são feitas por quem tem autoridade — não por quem está executando.

06

Comparativo e Aprendizados

Olhando as duas demandas lado a lado, fica claro o que cada camada do modelo está protegendo. Esta parte sintetiza as diferenças, os princípios que o caso reforçou e o que levamos para o próximo ciclo.

As duas demandas, ponto a ponto

DIMENSÃO	QUEUE VOTING	ACCESS CONTROL
Escalada ao CTO	Não	Sim — ampliada após intake
Passou por Discovery	Não	Sim — 3 incógnitas de integração
Complexidade arquitetural	Baixa	Alta
Estimativa final	14 dias	41 dias (revisada de 25)
Considerações de segurança	Ocultação de votos (server-side)	Modelo de acesso + OIDC + LGPD
Perfil de risco	Baixo	Alto
Tipo de deal	Retenção de renovação	Bloqueador pré-fechamento
Risco de escopo	Baixo	Alto (LGPD + dependência do cliente)
Dependências externas	Nenhuma	Cliente registra app no portal Azure
Versões do RP	v1 rejeitado · v2 aprovado	v1 aprovado direto
Sequência no plano	Primeira · release 26/abr	Paralela + foco · release 30/mai

Os três princípios que o caso reforçou

1 · O INTAKE CAPTURA, NÃO NEGOCIA

Tanto CS quanto Vendas registraram suas demandas em formato estruturado. **Nem Vendas confirmou prazo** (apesar do compromisso informal de 60 dias), **nem CS prometeu funcionalidade** ao Banco Meridional na chamada de renovação. A negociação só acontece quando o PM tem dados.

2 · O GATE SÓ ABRE QUANDO O ANTERIOR ESTÁ RESPONDIDO

O PM rejeitou o RP v1 da Demanda 1 não por preciosismo, mas porque *não tinha como planejar capacidade* sem saber o que aconteceria em desconexão do facilitador. A Demanda 2 só saiu de Discovery quando as três incógnitas tinham resoluções — não quando o time-box expirou.

3 · O DISCOVERY ECONOMIZA MAIS TEMPO DO QUE CUSTA

A Demanda 2 ganhou 16 dias de esforço durante o Discovery (Azure AD + LGPD). Se esses 16 dias tivessem aparecido em execução, o cronograma teria estourado, Vendas teria comunicado um prazo impossível ao cliente, e o deal estaria em risco. Os 7 dias do Discovery valeram semanas de execução.

O que esse caso provou

Não é o tamanho da demanda que define quanto processo ela precisa. É o quanto de incerteza ela traz e o quanto de risco ela carrega para o resto do sistema.

A Demanda 1 — pequena, simples, baixo risco — passou rápido pelo funil, mas ainda assim foi parada uma vez no gate do PM por *razões que economizaram retrabalho de execução*. A Demanda 2 — complexa, com compliance, com dependência externa — não foi parada porque o Discovery tornou explícito tudo que importava antes do escopo ser comprometido.

O modelo operacional não está aí para tornar tudo lento. Está aí para fazer com que cada camada responda sua pergunta antes de passar adiante. Quando uma demanda passa direto, é porque não havia o que esclarecer. Quando uma demanda é devolvida ou desvia para Discovery, é porque a próxima camada não teria como decidir sem a informação que falta.

Onde estamos agora

Estado em 29/mar	Ambos os Readiness Packages aprovados. Plano de Execução EP-2026-001 publicado.
D1 — Queue Voting	Em desenvolvimento. Sprint 1-2. Release alvo 26/abr.
D2 — Access Control	Em desenvolvimento. Sprint 1-5. Release alvo 30/mai.
Próximos gates	14/abr — registro Azure AD pelo cliente. 24/abr — QA da D1. 05/mai — RDS sa-east-1 provisionada.

O que levamos para o próximo ciclo

1. Alinhamento formal de gate de intake com Vendas — para que o próximo deal enterprise não chegue com compromisso de prazo já feito ao cliente. Já registrado como item processual no critério de sucesso do INT-2026-002.
2. O padrão de roteamento LGPD por tenant (Opção C) — agora reutilizável para qualquer requisito futuro de região de compliance. O investimento na Demanda 2 reduz o custo marginal dos próximos casos.
3. Os dois Readiness Packages como referência — RP-2026-001 v2 e RP-2026-002 v1 servem de gabarito para futuras racionalizações. Um é exemplo de escopo apertado sem escalada; o outro é exemplo de pacote multidisciplinar com CTO.

FIM DO CASO

Duas demandas concorrentes, caminhos distintos pelo mesmo funil, ambas prontas para entrega dentro da janela. O processo não fez milagre — ele fez exatamente o que foi desenhado para fazer: tornar cada decisão explícita e cada compromisso defensável.
